


जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कैलाली

निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ अन्तर्गत जि.वि.स.बाट आ.व. ०७१/७२ मा
संचालित योजना/आयोजनाहरूको अनुगमन उप-समितिद्वारा
गरिएको अनुगमन सुपरिवेक्षणको संयुक्त प्रतिवेदन

मिति :- २०७२/२/१० र ११ गते

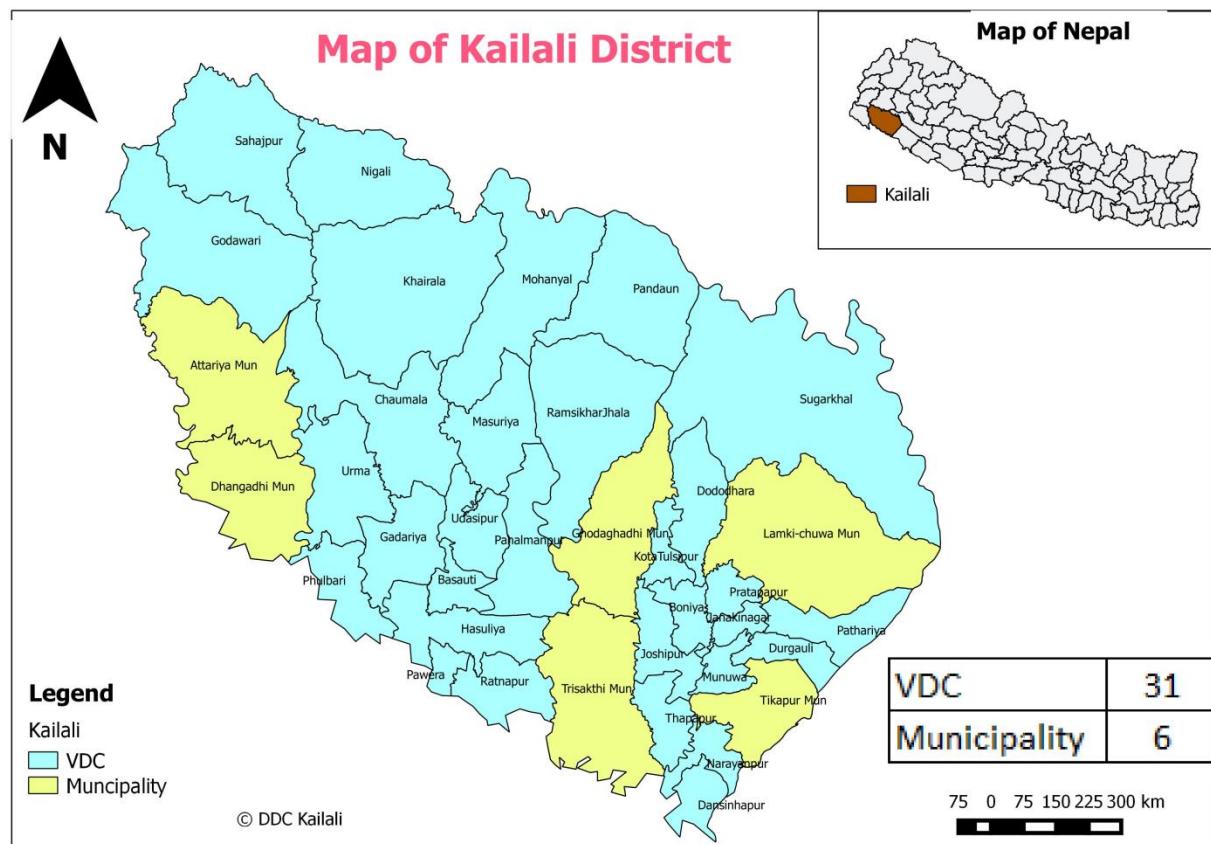

तयार गर्ने
शिवराज भाट
सूचना अधिकृत



नेपाल सरकार
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
कैलाली

१ परिचय (Background)

कुनै पनि विकास कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली अति नै आवश्यक हुन्छ । एका तर्फ योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्भावित चुनौतीहरु पहिला नै पहिचान गरी समयमै सुधारको लागि आवश्यक कदम चाल्न समेत अनुगमन कार्य गरिन्छ । त्यसैले अनुगमन सबै संलग्न हिस्सेदारहरुको लागि एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्थापन औजार हो । अनुगमनमा प्राप्त जानकारीहरुको आधारमा कार्यक्रमको काम गर्ने प्रक्रियामा समेत सुधार गर्न सकिन्छ ।

उपभोक्ता समितिहरुले आफुले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा उल्लेखित दायित्वहरु पुरा गरे नगरेको जांच गर्नु पनि अनुगमनको उद्देश्य हो । यस्तो खालको अनुगमनलाई Compliance Monitoring भनिन्छ । यस्तो खालको अनुगमनबाट प्राप्त जानकारीहरुले जिल्ला विकास कोष (DDF) बाट योजना निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिको खातामा निकासा गरिने कोषको लागि आधार प्रदान गर्दछ ।

योजना स्तरको वास्तविक जानकारी प्राप्त गर्नका साथै कार्यक्रमका लक्ष्य र उद्देश्यहरु कति हदसम्म पुरा भए भन्ने कुरा थाहा पाउन समेत अनुगमन गरिन्छ । यो कुरा भौतिक (जस्तै : कति मिटर रोड निर्माण भए) का साथै प्रक्रियागत (जस्तै : महिला पुरुष दुवै निर्णय प्रक्रियामा सहभागि भएको) र आर्थिक सबैमा लागु हुन्छ । हासिल हुने कार्यक्रमका उद्देश्यहरु मापन गर्ने सुचक वार्षिक कार्य योजना (Annual Work Plan) मा उल्लेख गरिएको छ ।

एउटा राम्रो अनुगमन प्रणालीले तयारी चरणको प्रारम्भमा गरिने आधारभूत तथ्यांक संकलन, नियमीत अनुगमन, विषेश अवश्थामा गरिने प्रभाव अध्ययन तथा मूल्यांकन अध्ययन जस्ता सम्पूर्ण कुराहरुलाई विश्वसनीय बनाउछ । आधारभूत तथ्यांकहरुले भविष्यमा गरिने प्रभाव वा मूल्यांकन अध्ययनहरुबाट प्राप्त तथ्यहरुलाई तुलना गर्न सहयोग गर्दछ । कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि सम्पूर्ण योजना चक्रमा एउटै आधार तथा सूचकहरुलाई प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।

अनुगमनबाट प्राप्त जानकारीहरु संलग्न विभिन्न सररोकारहरुलाई विभिन्न कारणले उपयोगी हुन्छन् । योजनामा लगानी गर्ने मुख्य लगानीकर्ताहरुलाई आफुले लगानी गरेको कोषको सदुपयोग भए नभएको वारेमा विषेश चासो हुन्छ । यस अर्थमा जि.वि.स., गा.वि.स., न.पा. को लागि योजनास्तरीय अनुगमन अति महत्वपूर्ण छ । जिल्ला विकास समितिको लागि योजनालाई तयारी वा कार्यान्वयन चरणमा लैजानु उपयुक्त छ, छैन भनेर निर्णय गर्न यस्ता जानकारीहरु आवश्यक हुन्छन् । उपभोक्ता समितिले अनुगमनबाट प्राप्त जानकारीहरुको आधारमा आफुले गरेका कामहरु सन्तोषजनक भए नभएको तथा गर्नुपर्ने सुधारहरुको वारेमा थाहा पाउँछन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाद्वारा विभिन्न गाउँ विकास समितिबाट विधिवत रूपमा छनौट भै आएका विकास योजनाहरुको जि.वि.स. कैलालीको २३ औं जिल्ला परिषदबाट आ.व. ०७१/७२ का लागि पारित भई विभिन्न

विकास निर्माणका योजनाहरु जि.वि.स. एवं सम्बन्धित गा.वि.स. मार्फत संचालन हुँदै आएका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासनले प्रदृत्त गरेको अधिकार बमोजिम स्थानीय स्तरमा नै उपभोक्ता समिति गठन गरि जि.वि.स.को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा योजनाहरु संचालन गरिन्छन् । स्थानीय उपभोक्ताहरुलाई विकास निर्माण कार्यमा संलग्न गराई अपनत्वको महशुस गरि सम्पन्न योजनालाई दिगोरूप दिनका लागी योजना निर्माण एवं संचालनमा उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता गराइएको हुन्छ । उक्त योजनाहरुको सही ढंगबाट संचालन एवं उपयोग भए नभएका बारेमा जि.वि.स., जिल्ला प्राविधिक कार्यालय एवं जिल्लाका राजनैतिक दलका प्रतिनिधीज्यूहरु, लोकतान्त्रिक गै.स.स. महासंघ, गै.स.स. महासंघ, पत्रकार महासंघ, विषयगत कार्यालय सहितको अनुगमन टोली बनाई बनाई कैलाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ मा जि.वि.स.द्वारा संचालित योजना, आयोजनाको मिति २०७२ जेष्ठ १० र ११ गते विभिन्न योजनाहरुको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरेको छ ।

उद्देश्य:

नेपाल सरकारको निर्देशिका र कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका बमोजिम कार्यक्रमले लिएको विशिष्ट उद्देश्य अनुसार गा.वि.स., न.पा.मा संचालन हुने विभिन्न क्रियाकलापहरु सबै अन्तरनिहित (**Cross-cutting issue**) क्रियाकलापको रूपमा रहन निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार यी सम्पूर्ण सूचकहरुको मापन योजनाको अनुगमनबाट स्पष्ट नहुने भएकोले निर्देशिका बमोजिम स्पष्ट गर्नका निमित्त गा.वि.स. स्तरीय अनुगमन एक महत्वपूर्ण औजार हुन गएको छ ।


निश्कर्ष :

जि.वि.स. अन्तर्गतका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, जि.वि.स. अनुदान, जि.वि.स. आन्तरिक कोष (चालु), जि.वि.स. कोष राजश्व (पूँजीगत)बाट उर्मा, फुलवारी गा.वि.स. र धनगढी नगरपालिका भित्र संचालित विभिन्न योजना/आयोजनाहरुको अनुगमन, सुपरिवेक्षण उप समितिले योजना स्थलमा गई अनुगमन गर्दा देखिएको कुरा माथी प्रतिवेदनमा बुँदा रूपमा प्रस्तुत भई सकेको छ । समष्टिगत रूपमा भन्नु पर्दा सम्पन्न भई सकेका योजनाहरु सन्तोषजनक छन् र केहीको ठेक्का बिल बनी लेखामा गई सकेको अवस्था छ भने केहीको ठेक्का बिल भई नसकेको अवस्था छ । केही योजनाहरु भरखर सुरु भईरहेका छन् भने एउटा योजनाको काम सम्भौता बाहेका अरु भएकै छैन । जिल्ला विकास समितिले दिने प्राविधिक सेवा पनि सन्तोषजनक नै छ प्राविधिकहरु आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा फिल्डमा गएको भेटिएको छ भने उपभोक्ता समितिले गर्ने काम राम्रै देखिएको छ । प्रत्येक योजनामा सूचना पाटी राखेको नभेटिएको । यो अनुगम जि.वि.स.का लागी निकै उपयोगी रह्यो र आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम नियमित संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अनुगमन गरिएका योजनाहरू

१. धनगढी नगरपालिका वा.नं. ८ हुलाकी सडकले जोड्ने क्याम्पस चोक ० प्वाइन्ट देखि पश्चिम दक्षिण साइटको नाली धनगढी नगरपालिकाले बनाई रहेकोमा वर्षातको समयलाई मध्यनजर गरि सो क्षेत्रमा पानी निकास नभई अत्यधिक डुवान क्षेत्रमा पर्ने भएकोले अर्को दक्षिण साइटको नाली अती आवश्यक भएको हुँदा दिर्घकालिन नाली निर्माणको लागी जि.वि.स.ले पहल गर्नुपर्ने र हाललाई अस्थायी नालीको व्यवस्थाका लागी जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

२. निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत रु. १४ लाख ५० हजारको उर्मा गा.वि.स.का विभिन्न बडाहरुमा ग्रामेल र ह्यूमपाईप जडानको योजना रहेको । जसमा धुरजन्ना पथरी गाउँको घाट देखि भानु मा.वि. जाने बाटो ७५० मी. ग्रामेल भएको छ । उर्मा २ डुमलियामा ३०० मी. ग्रामेल, धुरजन्ना देखि भानु मा.वि.सम्म ३७५ मी. ग्रामेल, कनरी बेहडाबाबा कृषि सडक जरहीको कल्भर्टसम्म ६०० मी. ग्रामेल गरि विभिन्न स्कीममा ग्रामेल र ह्यूमपाईप जडान भएको छ ।

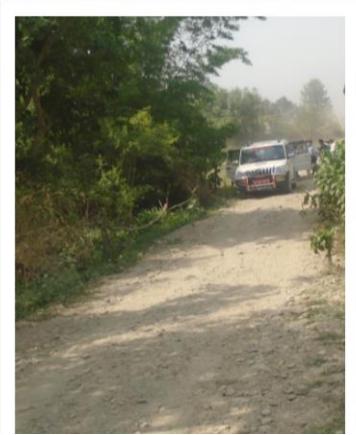

पथरी गाउँको घाट देखि भानु मा.वि. सम्म सडक ग्रामेल

इष्टीमेट गरिएको रकम :- १४,५०,०००।

हालसम्मको प्रगती :- काम राम्रोसँग भएको छ ।

राम्रा पक्ष :- रकम समयमा निकासा भएको र अन्तिम किस्ता निकासा हुन बाँकी ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी राख्नु पर्ने, सार्वजनिक परिक्षण गर्नु पर्ने ।

अन्य सुभाव :- यो बाटो आवत जावतको दृष्टीकोणले निकै व्यस्त बाटो भएकोले आगामी कार्यक्रममा कालोपत्रेका लागी जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम : आशाराम राना

३. **योजनाको नाम :** भानु मा.वि. पथरी भवन निर्माण (जि.वि.स. अनुदान)

स्थान :- उर्मा ७

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ५,६०,२०४।

स्वीकृत रकम :- ५ लाख

हालसम्मको प्रगती :- डि.वि.सी.सम्मको ३ कोठाको काम सम्पन्न भएको । काम सन्तोषजनक रहेको । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पनि २४ लाखको ब्लक निर्माण भई रहेको र हाल जग खन्ने काम भई रहेको ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सबैले देख्ने ठाउँमा कार्यक्रम र रकम सहितको सूचना पाटी राख्नु पर्ने र सम्पूर्ण खर्चको सार्वजनिक परिक्षण गर्नु पर्ने ।

अन्य सुभाव :- यो विद्यालय २०१७



सालमा स्थापना भएता पनि भौतिक संरचनाको अभाव रहेको । विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप धेरै रहेको । एक कक्षा पनि ३ वटा सेक्सनसम्ममा बाडिएको र छात्र भन्दा छात्रको संख्या पनि धेरै रहेकोले आगामी कार्यक्रममा बाँकीकाम सम्पन्न गर्न क्रमागान योजनामा राख्न जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट २४ लाख अन्तर्गतको ब्लकको काम भई रहेको तर काम निकै सुस्त गतीमा भईरहेकोले जि.वि.स. मार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई काम चाँडो सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्न सिफारिस गर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम : अनुपम चौधरी

४. योजनाको नाम :- शिवगंगा नदी तटवन्धन निर्माण (जि.वि.स. आन्तरिक कोष चालु)

स्थान :- उर्मा ७, दिपनगर

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ३,३१,२५१

स्वीकृत रकम :- ३ लाख

हालसम्मको प्रगती :- काम ठिकसँग भएको छ । इन्टिमेट अनुसारको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भई सकेको ।

राम्रा पक्ष :- थोरै रकममा पनि राम्रो काम गरेको छ ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- थप तटवन्ध नगर्दा बढी क्षती हुन सक्ने भएको नदी छेउमा बोट विरुवाहरु रोपी क्षती न्यूनीकरण गर्नु पर्ने । सार्वजनिक परिक्षण नगरिएको र सूचना पाटी पनि राख्ने पर्ने ।

अन्य सुभाव :- वर्षायाममा नदीको बहाव बढी हुने हुँदा अहिले गरिएको सानो तटवन्धनले क्षेत्री न्यून गर्न केही मात्रामा मात्र सहयोग गर्न सक्ने भएकोले नजिकै विद्यालय र गाउँ समेत भएको हुँदा आगामी कार्यक्रममा बढी रकम विनियोजन गरि तटवन्धन गर्न जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- सन्तोष घर्तिमगर

५. योजनाको नाम :- ट्रान्सफरमर खरिद जडान (जि.वि.स. आन्तरिक कोष)

स्थान :- उर्मा ७, धुरजन्ना

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ६ लाख

स्वीकृत रकम :- ६ लाख

हालसम्मको प्रगती :- काम ठिकसँग भएको छ । ट्रान्सफरमर खरिद, विद्युतपोल गाड्ने काम र तार तान्ने काम सबै सम्पन्न भएको ।

राम्रा पक्ष :- जिल्ला दररेट कम हुँदा समेत नगर्दै श्रमदान गरि ट्रान्सफरमरमा रकम थपी खरिद गरेको ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी पनि राख्ने पर्ने, सार्वजनिक परिक्षण गर्नु पर्ने ।

अन्य सुभाव :- काम राम्रो भएको र सम्पन्न समेत भईसकेकोमा मूल्याकानन नभई एक किस्ता पनि रकम निकासा नभएकोले छिटो मूल्याकानका लागी जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने । विद्युत ट्रान्सफरमरको जिल्ला दररेट रु. २,८६,००० भएकोमा बजार रेट जिल्ला दररेट भन्दा धेरै रु. ४,२१४९० बढी भएता पनि शिवगंगा ग्रामीण विद्युत सहकारी समूहले बढी रकम नगदै थपी खरिद गरेकोले उपभोक्ताको सो बढी रकम जि.वि.स.बाट निकासाका लागी आशा गरेका ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- रामदिन चौधरी



६. योजनाको नाम :- कालिका प्रा.वी. भवन निर्माण (जि.वि.स. कोष राजश्व) ३ कोठे
 स्थान :- उर्मा ७
 इष्टीमेट गरिएको रकम :- ५,६०,७३१
 स्वीकृत रकम :- ५ लाख
 हालसम्मको प्रगती :- काम राम्रो भएको छ। इन्टिमेट अनुसारको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भई सकेको।
- राम्रा पक्ष :-** शिक्षक दरवन्दी एक मात्र भए पनि निजी श्रोतबाट स्कूल संचालन गरेको। समयमै काम सम्पन्न गरि सम्पूर्ण निकासा लिएको।
- सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :-** सूचना पाटी राख्नु पर्ने, सार्वजनिक परिक्षण गराउनु पर्ने।
- अन्य सुभाव :-** ढोकाको चौखट चोरि भएको, स्कूलको ५ लाख रकमबाट छतमात्र ढलान भएकोले बाँकी दिवालको काम, भ्याल ढोकाको र फिनिसिंगको काम बाँकी रहेकोले सो योजना आगामी कायक्रममा राख्नका लागी जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने साथै विद्यार्थी संख्या १८० हुँदा हैंदै पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट एक जना राहत शिक्षकको कोटा मात्र भएकोले थप दरवन्दीका लागी जि.वि.स. मार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने।
- उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :-** भंगीराम चौधरी
७. योजनाको नाम :- डुमलिया सुगरिया नाला कल्भर्ट निर्माण निर्माण (जि.वि.स. कोष राजश्व)
 स्थान :- उर्मा २
 इष्टीमेट गरिएको रकम :- ३,०७,२८५
 स्वीकृत रकम :- २ लाख ४० हजार
 हालसम्मको प्रगती :- काम ठिकसँग भएको छ। इन्टिमेट अनुसारको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भई सकेको। दिवाल बनाएको । ६ मीटर स्पान भएको कल्भर्ट। काम सम्पन्न हुँदा समेत अन्तिम किस्ता रकम नगएको।
- राम्रा पक्ष :-** थोरै रकममा पनि महिलाहरुको सहभागितामा ६ मी. स्पानको ठूलो कल्भर्ट बनाउने कामको थालनी गरेको। उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा महिला राखिएको।
- सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :-** सूचना पाटी राख्नु पर्ने, सार्वजनिक परिक्षण गराउनु पर्ने। जि.वि.स.बाट थप रकम रु. २ लाख गएकोमा सोको काम नगरेको र सोको छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्नु पर्ने।



कल्भर्टको निरिक्षण गर्नुहुँदै प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर श्री प्रेम दत्त भट्टज्यू

अन्य सुभाव :- वर्षातको समय नजिक आउन लागेकोले थप रकमको काम छिटो सम्पन्न गर्न जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने र एउटै योजनामा पनि रकम थप हुँदा थप रकमको कामका लागी अर्को उपभोक्ता समिति बनाएको ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- रुपनी देवी चौधरी

- ८.** **योजनाको नाम :-** बेहडाबाबा उ.मा.वि. काँटेतार (जि.वि.स. आन्तरिक कोष चालु)

स्थान :- उर्मा ५

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ३,९८,३८८

स्वीकृत रकम :- ३ लाख ५० हजार

हालसम्मको प्रगती :- काम ठिकसँग भएको छ । इन्टिमेट अनुसारको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भई सकेको । पहिले भवन निर्माण र मर्मत भनी योजना छनौट भएकोमा हाल आएर योजना परिवर्तन गरि स्कूल घेरवार काँटेतार राखिएको ।

राम्रा पक्ष :- विद्यालयको क्षेत्रफल भरि काँटेतार लगाई सम्पत्ती संरक्षण गरेको ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सार्वजनिक परिक्षण नगरिएको र सूचना पाटी पनि सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- दरवारी राना

- ९.** **योजनाको नाम :-** उर्मा गा.वि.स. को कम्पाउण्डवाल निर्माण (जि.वि.स. कोष राजश्व)

स्थान :- उर्मा गा.वि.स.

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ३ लाख

स्वीकृत रकम :- ३ लाख

हालसम्मको प्रगती :- काम भरखर शुरु हुन गई रहेको, ईटा ढुङ्गा योजना स्थलमा खसालेको । ७० मीटर लम्बाईको जग खन्ने काम शुरु हुन थालेको । गा.वि.स.बाट कार्य सम्पादन हुने गरि योजनाको सम्पूर्ण रकम गा.वि.स.को खातामा अनुदानको रूपमा गइसकेको ।

राम्रा पक्ष :- गा.वि.स.ले ईटा, ढुङ्गा अन्य अन्य मालसामानको ढुवानीको लागी आफ्नै ट्याक्टर प्रयोग गरेको ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- काममा ढिलाई गरेकोले छिटो गनु पने । गा.वि.स.को आफ्नै प्राविधिक नभएको हुँदा अन्य संस्थाबाट सहयोग लिनु पर्ने ।

अन्य सुभाव :- गा.वि.स.ले काममा ढिलाई गरेको हुँदा छिटो काम सम्पन्न गर्नको लागी जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- गा.वि.स. आफै (सम्पर्क व्यक्ति खरिदार श्री खडक सिंह चौधरी)



१०. योजनाको नाम :- फुलवारी गा.वि.स.मा विभिन्न ९ वटा स्कीमहरूमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्ततगतको तपसिल बमोजिमको स्कीमहरू

- फुलवारी बी गाउँ वा.नं. ७ मा ४०० मी. लम्बाई को रु. १,१२,००० मा बाटो ग्राभेल र प्रति ह्यूमपाई १८ हजारका दरले ४ वटा ह्यूमपाईप जडान ।
- फुलवारी टाउन नं. २६ वा.नं. १ मा ४०० मी. लम्बाईको रु. १,१९,०० हजारमा बाटो ग्राभेल ।
- फुलवारी आई गाउँ वा.नं. ३ मा ४२५ मी. लम्बाईको रु. १,२२,००० मा बाटो ग्राभेल र थप अन्य रकमबाट १ ९० एम.एम. र २ ४५ एम.एम.को ह्यूमपाईप जडान ।
- फुलवारी वा.नं. २ जे गाउँमा ४५० मी. लम्बाईको १,४१,००० मा बाटो ग्राभेल ।
- फुलवारी वा.नं. ६ एफ गाउँ जाने बाटो ११५ मी. लम्बाई तर बनाएको १४० मी. लम्बाईको रु. १,१०,००० को बाटोमा माटो पटान र एक थान ९० एम.एम.को ह्यूमपाईप ।
- फुलवारी वा.नं. ४ ई गाउँ भटटराई टोल मा ४१० मी. ग्राभेल तर गरेको ४२५ मी. रु. १,१६,००० मा ग्राभेल गरेको र ह्यूमपाईप ३० एम.एम.को १ वटा ।
- फुलवारी सी गाउँ लम्बाई ४५० मी. तर भएको ५५० मी. रु. १,१९,००० हजारमा सडक ग्राभेल ।
- फुलवारी डी र एच गाउँको सिमानामा १ कि.मी. रु. २,५८,००० मा ग्राभेल र २ वटा ९० एम.एम.को ह्यूमपाईप ।
- फुलवारी वा.नं. ५ ए गाउँको १ कि.मी. बाटो रु. १,७१,००० मा ग्राभेल ।

स्थान :- फुलवारी गा.वि.स.

इष्टीमेट गरिएको रकम :- १५ लाख

स्वीकृत रकम :- १५ लाख

हालसम्मको प्रगती :- काम राम्रो भएको छ । सम्पूर्ण काम सिद्धिएको । विभिन्न बाटोमा विभिन्न साईजका ह्यूमपाईप जडान भएको । एफ गाउँ जाने बाटा निकै खाल्डो भएको तर माटो पटान गरेर निकै राम्रो बाटो बनाएको ।

राम्रा पक्ष :- इस्टिमेट भन्दा पनि बढी काम भएको ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी राख्नु पर्ने र सार्वजनिक परिक्षण गर्नु पर्ने ।

अन्य सुभाव :- फुलवारी वा.नं. ६ एफ गाउँ जाने बाटोमा आगामी वर्ष ग्राभेल र अन्तिम किस्ता निकासाका लागी जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- मान बहादुर खत्री



फुलवारी एफ गाउँको बाटो अनुगमनका क्रममा स्थानीय र राजनैतिक दलका प्रतिनिधीज्यू विच छलफल



फुलवारी वा.नं. ४ ई गाउँको बाटो अनुगमन गर्दै

- ११.** योजनाको नाम :- धनगढी न.पा. वा.नं. २ महता टोल र जनजागृती टोलमा कालोपत्रे र उपभोक्ताको कम्तीमा ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा
- स्थान :- धनगढी नगरपालिका वा.नं. २ सन्तोषी टोल
- इष्टीमेट गरिएको रकम :- १० लाख
- स्वीकृत रकम :- १० लाख
- हालसम्मको प्रगती :- काम राम्रो भएको छ ।
- सम्पूर्ण काम सिद्धिएको । जि.वि.स.बाट सबवेसको काम मात्र रहेको र ५ लाख भन्दा बढी नगद श्रमदान गरेको । पिचको काम उपभोक्ता आफैले गरेको । इष्टीमेट भन्दा दोब्बर बढी काम गरेको । महता टोलमा १५० मी. गर्नु पर्नेमा ३६० मी. गरेको र जागृती टोलमा ६८ मी. गर्नुपर्नेमा १५० मी. काम गरेको देखिन्छ ।
- राम्रा पक्ष :- इस्टीमेट भन्दा पनि बढी काम भएको । उपभोक्ताहरूले आफै नगदै श्रमदान गरि पिच गरेको र उपभोक्ताको निकै सहभागिता रहेको ।
- सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी राख्नु पर्ने र सार्वजनिक परिक्षण गर्नु पर्ने ।
- अन्य सुझाव :- धना महताको घर देखि मल्लको घरसम्म विद्युत तार घरको छतमा गएकोले पोल सार्नु पर्ने उपभोक्ताहरूको गुनासो रहेको हुँदा जि.वि.स. मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढीलाई सिफारिस गर्नु पर्ने ।
- उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- नर बहादुर महता
- १२.** योजनाको नाम :- कब्रस्थान मर्मत (जि.वि.स. कोष राजश्व)
- स्थान :- धनगढी नगरपालिका वा.नं. २
- इष्टीमेट गरिएको रकम :- ४,४५,१५९
- स्वीकृत रकम :- ४ लाख
- हालसम्मको प्रगती :- वाल, माटो फिलिगं काम गरेको । र्यावियन जालीको काम बाँकी ।
- सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी राख्नु पर्ने र सार्वजनिक परिक्षण गर्नु पर्ने ।
- अन्य सुझाव :- काम निकै पहिला सुरु गरेता पनि काम सुस्तगती गर्दैरहेकोले इस्टीमेट अनुसार सयममा काम सम्पन्न गर्न उ.स.लाई जानकारी गराउनका लागी जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने
- उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- शेख अहमद मुनिर



बाटो अनुगमन गर्दै प्र.जि.ई. सहित उपभोक्ता र राजनैतिक दलका प्रतिनिधीज्यूहरु



कब्रस्थानमा बनेको वाल

- १३.** योजनाको नाम :- छटघाट निर्माण (जि.वि.स. अनुदान)
स्थान :- धनगढी नगरपालिका वा.नं. २
स्वीकृत रकम :- ८ लाख
हालसम्मको प्रगती :- काम सन्तोषजनक रहेको । सम्भौता भई इस्टिमेट अनुसार छटघाट निर्माण र जाली प्रोटेक्सनको काम अन्तिम चरणमा रहेको ।
सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी राख्नु पर्ने र सार्वजनिक परिक्षण गर्नु पर्ने ।
- १४.** योजनाको नाम :- तिल्केताल सामुदायिक वनको हातामा मलामी स्थल/विश्राम स्थल निर्माण (जि.वि.स. अनुदान)
स्थान :- धनगढी नगरपालिका वा.नं. २
इस्टीमेट गरिएको रकम :- ५ लाख
स्वीकृत रकम :- ५ लाख
हालसम्मको प्रगती :- सम्भौता भएको तर सामुदायिक वनसँग जग्गा विवादका कारणले हालसम्म कुनै काम नभएको ।
सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सामुदायिक वनसँग छलफल गरि समस्या समाधान गर्नु पर्ने ।
अन्य सुझाव :- एक हप्ताभित्र सम्भौता अनुसारको काम अगाडी बढाउन उपभोक्ता समितिलाई पत्राचार गर्ने र यदि सो समयमा काम अगाडी नबढाएमा वैकल्पिक योजना प्रस्ताव गर्न जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने ।
उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- टेक बहादुर रैका
- १५.** योजनाको नाम :- जनता नि.मा.वि. विशालनगरको थप संरचना निर्माण (निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम)
स्थान :- ध.न.पा. वा.नं. ३, विशालनगर
इस्टीमेट गरिएको रकम :- १० लाख
स्वीकृत रकम :- १० लाख
हालसम्मको प्रगती :- सम्भौता भएको डी.वि.सी.सम्म ४ कोठे भवनको काम भएको र बाँकी इस्टीमेट अनुसारको ढलानसम्मको काम बाँकी रहेको । काम सन्तोषजनक रहेको । काम पैषा अभावका कारण सुस्त गतीमा भई रहेको र पहिलो किस्ता रकम पनि निकासा नभएको ।
सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी राख्नु पर्ने, काम छिटो गर्नुपर्ने ।
अन्य सुझाव :- ठेक्का बिल भई लेखामा गएको र उ.स.ले लेखामा बुझ्दा चेक काटिई बैकमा गई सकेको भनिएता पनि खातामा रकम जम्मा नभएको उ.स.को गुनासो रहेको ।
उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- दिपेन्द्र शाह



जग्गा विवादिन स्थानमा उपभोक्ता समितिसँग छलफल गर्दै प्र.जि.ई. श्री प्रेम दत्त भट्टज्यू



जनता नि.मा.वि.को बन्दै गरेको संरचना

१६. योजनाको नाम :- मोहना नदी विरेन्द्र चोक देखि शान्ति सामुदायिक वनसम्म सडक ग्राम्भेल (जि.वि.स. आन्तरिक कोष चालु)

स्थान :- ध.न.पा. वा.नं. ३

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ३,५१,३६०

स्वीकृत रकम :- ३ लाख

न.पा.बाट रकम :- १ लाख

सामुदायिक वनबाट रकम :- २ लाख ४० हजार

हालसम्मको प्रगती :- ग्राम्भेलिङ्ग, सववेसको काम सम्पन्न भएको । जि.वि.स.को पाटो सववेससम्मको मात्र रहेको । तर योजना परिवर्तन गरि अन्य संस्थाको सहयोगमा ५५ मी. कालोपत्रे गर्ने भनिएकोमा २३० मी. गर्ने लक्ष्य लिएर काम भई रहेको ।

राम्रो पक्ष :- इस्टीमेट भन्दा पनि बढी काम गर्ने उद्देश्यले काम भई रहेको ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी राख्नु पर्ने ।

अन्य सुभाव :- काम ढिलो भई रहेकोले छिटो सम्पन्न गर्नु पर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- मनोज सार्की



सववेसको कामको अवलोकन गर्दै

१७. योजनाको नाम :- दार्चुला सेवा समिति भवन निर्माण र तटवन्धन (जि.वि.स. आन्तरिक कोष)

स्थान :- ध.न.पा. वा.नं. ५, तारानगर

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ९ लाख

स्वीकृत रकम :- ९ लाख

हालसम्मको प्रगती :- योजना परिवर्तन गरि भवन निर्माणमा ८ लाख र तटवन्धनमा १ लाख छुट्याएको रहेछ । अहिले जगको काम भई राखेको र बाँकी ढलाईसम्मको काम बाँकी रहेको । वालको काम इस्टीमेटमा नभएको

। काम ढिलो गतीमा भई रहेको । तटवन्धनका लागी योजना स्थलमा ढुगां र जाली खसालिएको र छिटौ काम हुने उ.स.बाट जानकारी ।

राम्रो पक्ष :- भवनको छेउमै खोला भएकोले सोको रोकथामको तटवन्धन भई रहेको ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी राख्नु पर्ने ।

अन्य सुभाव :- काम ढिलो भई रहेकोले छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्नु पर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- राजेन्द्र सिंह सामन्त



दार्चुला सेवा समितिको भवन निर्माण स्थल

१८. योजनाको नाम :- मानव अधिकारीका लागी एकल महिला समूहको अधुरो भवन निर्माण (निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम)

स्थान :- ध.न.पा. वा.नं. ५, तारानगर

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ७ लाख

स्वीकृत रकम :- ७ लाख

हालसम्मको प्रगती :- अधुरो रहेको भवनमा चिनाई, भयाल ढोकाको काम भई रहेको, पलाप्टर र फिनिसिङ्गंको काम बाँकी । भवन राम्रो बनेको छ र काम संतोषजनक रहेको छ । ईटा, बालुवा, सिमेन्ट योजना स्थलमा खसालेको ।

राम्रो पक्ष :- एकल महिलाहरूको सक्रियतामा थोरै बजेटमा राम्रो काम भईरहेको ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्ने ।

अन्य सुझाव :- अहिलेसम्म कुनै निकासा नभएकोले पहिलो किस्ता निकासाका लागी जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- टीकेश्वरी हमाल



एकल महिला समूहको भवन निर्क्षण गर्दै
राजनैतिक दलका प्रतिनिधी सहित प्र.जि.ई.ज्यू

१९. योजनाको नाम :- फारवेष्ट स्कुलको पूर्वको विल्डींग देखि उत्तरबाट पूर्व सिंहजीको घर अगाडी सडक कालोपत्रे (जि.वि.स. अनुदान)

स्थान :- ध.न.पा. वा.नं. ५

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ५ लाख

स्वीकृत रकम :- ५ लाख

हालसम्मको प्रगती :- अली ढिलो गतीमा काम भई रहेको । ग्राभेलसम्मको काम भएको, वेस विछ्याईएको । ७८ मी. ल.ई. अनुसार काम गर्नु पर्नेमा ९१ मी. गर्ने लक्ष्य लिईएको

राम्रो पक्ष :- ल.ई. भन्दा बढी काम गर्ने लक्ष्य लिईएको ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्ने ।

अन्य सुझाव :- निकट भवीष्यमै वर्षात शुरु हुन लागेकोले कालोपत्रेको काममा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने भएको हुँदा ढिलो काम भई रहेकोले वर्षात अगावै समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागी जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- कर्ण बहादुर सिंह



२०. योजनाको नाम :- पूर्णानन्द पाण्डेको घर अगाडी सडक कालोपत्रे (जि.वि.स. आन्तरिक कोष चालु)

स्थान :- ध.न.पा. वा.नं. ५, तारानगर

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ५ लाख

स्वीकृत रकम :- ५ लाख

हालसम्मको प्रगती :- कालोपत्रे सम्पन्न भई सकेको । काम सन्तोषजनक रहेको । दुई ठाउँमा ल.इ. अनुसार ८० मी. को काम भएकोमा १२५ मी. गरेको । बिल बनेको तर पैषा खातामा नगएको ।



सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्ने र सार्वजनिक परिक्षण गराउनु पर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- भुमिराज जोशी

२१. **योजनाको नाम :-** जनजाती कल्याण आमाको माया छात्रावास विविध भौतिक पूर्वाधार निर्माण (जि.वि.स. कोष राजश्व पूँजीगत)

स्थान :- ध.न.पा. वा.नं. १ र ५

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ४ लाख

स्वीकृत रकम :- ४ लाख

हालसम्मको प्रगती :- हाती पाईलेसम्म सरिया खडा गरि काम गरेको । हाती पाईले राम्रोसँग बनाएको । काम सन्तोषजनक रहेको । माथी उठाउन केही भागको काम बाँकी रहेको ।



सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- शारदा शाह

२२. **योजनाको नाम :-** साईबाबा मन्दिर उत्तर सडक ग्रामेल र विद्युत विस्तार (जि.वि.स. कोष राजश्व पूँजीगत)

स्थान :- ध.न.पा. वा.नं. ५

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ३,३२,२२३

स्वीकृत रकम :- ३ लाख

हालसम्मको प्रगती :- योजना परिवर्तन गरि ग्रामेलको सट्टा बाटो पि.सी.सी. गर्ने ६३ मी. को काम सम्पन्न भएको । दुई वटा विद्युत पोल गाडिएको । काम सन्तोषजनक रहेको



सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्ने र सार्वजनिक परिक्षण गराउनु पर्ने ।

२२. **योजनाको नाम :-** चकमली बजार पछाडी नालीको ढक्कन निर्माण (जि.वि.स. अनुदान)

स्थान :- ध.न.पा. वा.नं. १ र ८

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ५,६४,३२९

स्वीकृत रकम :- ५ लाख

हालसम्मको प्रगती :- १६० मी. लम्बाई भएको नालीको भित्री प्लाष्टर र ढक्कन निर्माणको काम सम्पन्न भएको । काम सन्तोषजनक रहेको । एक किस्ता मात्र रकम निकासा भएको र उ.स.ले अन्तिम किस्ता निकासाको लागी कुरा राखेको ।



सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्ने र सार्वजनिक परिक्षण गराउनु पर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- अशोक कुमार चौधरी

- २३.** **योजनाको नाम :-** शिव मन्दिर पर्खालि निर्माण अद्वाम सेवा समिति (जि.वि.स. कोष राजश्व) **स्थान :-** ध.न.पा. वा.नं. १, शिवनगर **इष्टीमेट गरिएको रकम :-** ५ लाख ८० हजार **स्वीकृत रकम :-** ५ लाख ८० हजार **हालसम्मको प्रगती :-** पर्खालि निर्माणको काम निकै राम्रो गरेको । नगद श्रमदान १ लाख लगाएको । नि.क्षे.वि.का.बाट थप १ लाख भवनको तला थपका लागी गएको र त्यसको काम अहिले सुरु नभएको ।



सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सूचना पाटी सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्ने र सार्वजनिक परिक्षण गराउनु पर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- पदम सिंह कुँवर

- २४.** **योजनाको नाम :-** कैलाली बहुमुखी क्याम्पस पछाडी चौधरी बस्ती नजिक नालामा तटवन्धन निर्माण (जि.वि.स. अनुदान) **स्थान :-** ध.न.पा. वा.नं. १ र ८ **इष्टीमेट गरिएको रकम :-** २,२६,१९२ **स्वीकृत रकम :-** २ लाख **हालसम्मको प्रगती :-** तटवन्धनको काम राम्रो गरेको । काम सम्पन्न भएको र अन्तिम किस्ता निकासा हुन बाँकी ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सार्वजनिक परिक्षण गराउनु पर्ने ।

अन्य सुझाव :- खोला छेउमा धेरै बस्ती भएकोले उक्त बस्ती जोखिममा रहेको । आगामी कार्यक्रममा उक्त योजनालाई



क्रमागतमा राखी थप काम गर्नु पर्ने देखिएकोले जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम :- सन्तराम कठिरिया

- २५.** **योजनाको नाम :-** बुद्धमार्ग टोलको मेनरोड देखि दक्षिण चित्रराज पन्तको मिल देखि प्रेम आलेको घर बाटो हुँदै हरिराम श्रीपाईलीको घर भएर जाने सडक निर्माण सुधार कालोपत्रे (जि.वि.स. आन्तरिक कोष चालु)

स्थान :- ध.न.पा. वा.नं. १ र ८

इष्टीमेट गरिएको रकम :- ५ लाख

स्वीकृत रकम :- ५ लाख

हालसम्मको प्रगती :- कालोपत्रे गर्ने काम स्वीकृत भएता पनि पछि योजना परिवर्तन गरि नाली निर्माणको काम गरिएको । ३०० मी. लम्बाईमा १५० मी. जटी काम भएको छ । काम सन्तोषजनक रहेको छ । पहिलो किस्ता रकम निकासा भएको । वर्षातको समय नजिकिदै गर्गा काम छिटो गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्ष :- सबैले देख्ने ठाउँमा सूचना पाटी राख्नु पर्ने ।

अन्य सुभाव :- काममा ढिलाई भई रहेकोले समयमै काम सम्पन्न गर्न जि.वि.स.लाई सिफारिस गर्ने ।



समाप्त
